



PNC

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 2: adempimenti e attività al 31 dicembre 2021

2020
2021
2022
2023



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 2: adempimenti e attività al 31 dicembre 2021

INDICE


CAPITOLO 1 - Aggiornamenti e informazioni relative allo stato di avanzamento	1
CAPITOLO 2 - Il IV trimestre 2021 - Il dettaglio	3
CAPITOLO 3 - Focus legge bilancio 2022	5
Allegato 1	7
Programmi e interventi del PNC	7
Programmi e interventi cofinanziati - disposizioni inserite nel D.L. n. 152 del 2021	23

CAPITOLO 1 - Aggiornamenti e informazioni relative allo stato di avanzamento.

Con il report n. 1 sono stati forniti elementi di inquadramento generale del PNC anche in relazione ai rapporti del Piano con il PNRR; in particolare è stato fornito un focus sul decreto MEF del 15.07.2021 e sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi della prima scadenza, fissata al 30 settembre 2021, offrendo una istantanea dello stato di avanzamento dei progetti del piano alla scadenza indicata.

Il presente report riepiloga le scadenze dell'anno 2021 (III e IV trimestre), gli obiettivi e gli adempimenti previsti, tenendo conto che all'interno di ogni obiettivo, in alcuni casi, sono previsti anche più adempimenti (figura 1).

Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

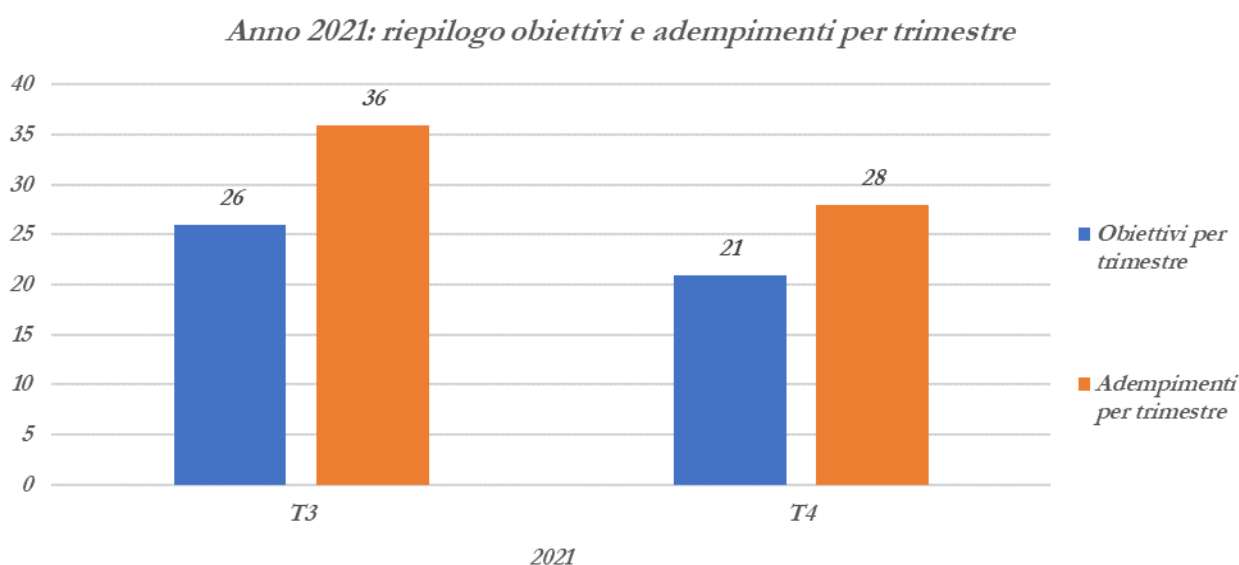


Il quadro di dettaglio, con separata evidenza – per ogni obiettivo – dello stato di tutti gli adempimenti previsti, è contenuto nella tabella di cui all'[allegato 1](#), redatta sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite dalle Amministrazioni interessate.

Dal quadro riepilogativo del III e IV trimestre emerge che gli obiettivi prestabiliti possono ritenersi raggiunti, eccezion fatta per il programma F.1 "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale del MISE e per il programma H.1 "Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del MIPAAF (figura 2).

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

Stato complessivo degli obiettivi relativi ai trimestri III e IV del 2021

- Completato
- Parzialmente completato
- Non avviato

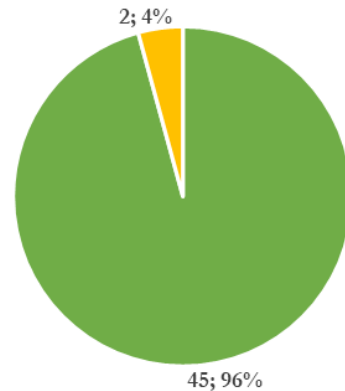

Quanto al programma Polis, il parziale raggiungimento dell'obiettivo (nello specifico, l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica degli aiuti di Stato) discende da fattori che esulano dalla disponibilità dell'Amministrazione titolare che si è attivata con la pre-notifica alla Commissione Europea sin dal 19 luglio 2021. Sul punto, peraltro, l'Amministrazione ha auspicato l'applicazione della procedura accelerata per la decisione sull'approvazione degli aiuti di Stato prevista per i progetti del PNRR, denominata "fast track", anche al Programma "Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale".

Per il programma del MIPAAF, invece, l'obiettivo è stato considerato parzialmente conseguito non essendo stato pubblicato il bando per il settore agroalimentare (e florovivaistico), pur prendendo atto che l'Amministrazione ha rappresentato la necessità di attendere, prudenzialmente, la registrazione del decreto ministeriale volto alla definizione del regime di aiuti prima.


Le Amministrazioni non hanno evidenziato, al momento, criticità ai fini del rispetto degli adempimenti previsti dagli obiettivi relativi alle scadenze successive.

L'allegato 1 contiene, infine, gli aggiornamenti e le informazioni relative ai programmi e agli interventi cofinanziati con il PNRR, limitatamente alle disposizioni inserite nel decreto legge n. 152 del 2021 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", che hanno interessato il PNC.

CAPITOLO 2 - Il IV trimestre 2021 - Il dettaglio

Come emerge dalla Figura 1, alla scadenza del **31 dicembre 2021** (T4 2021), nel DM MEF sono previsti **21 obiettivi** ripartiti tra le diverse Amministrazioni come da figura 3.

Figura 3. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

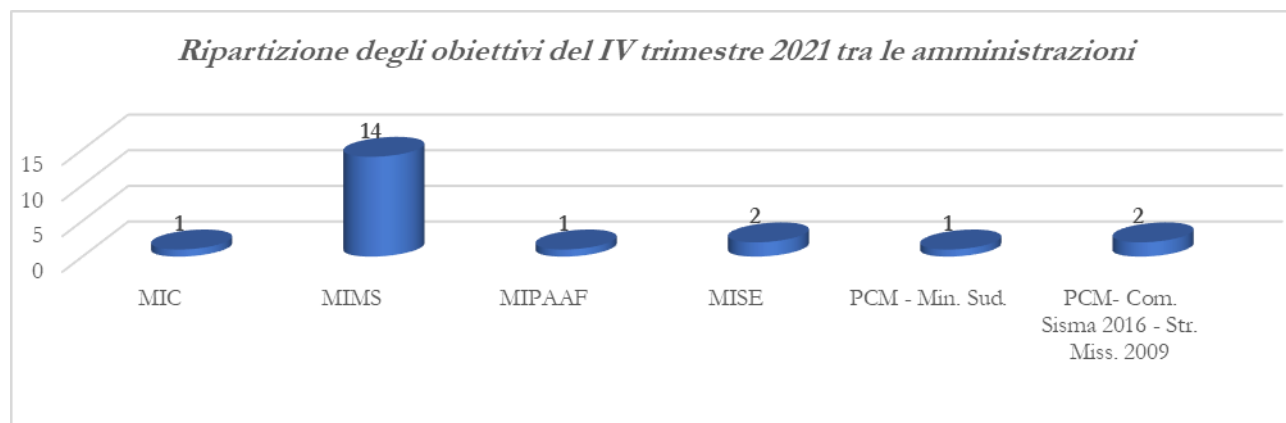


Nella figura 4 è riportato lo stato di completamento dei **21 obiettivi**; si evince che il tasso di realizzazione è pari al 90%, essendo stati raggiunti, come detto, tutti gli obiettivi eccetto quelli sopra evidenziati.

Figura 4. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

Stato degli obiettivi al IV trimestre 2021

- Completato
- Parzialmente completato
- Non avviato

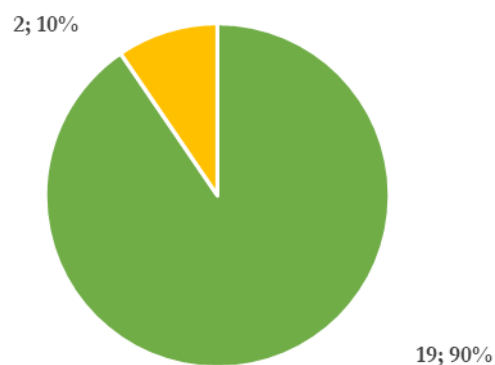

I 21 obiettivi si sostanziano in **28 adempimenti** di cui 2 risultano in ritardo:


Adempimenti in ritardo

Rif.	Programma/Investimento/Intervento	Amministrazione	Adempimento
F.1	"Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MISE	Autorizzazione UE
H.1.	Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	MIPAAF	Pubblicazione nuovo bando settore agroalimentare (e florovivaistico)

Figura 5. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

Stato degli adempimenti al IV trimestre 2021

- Stato: Completata
- Stato: In ritardo

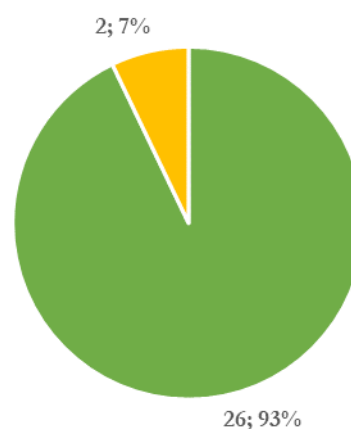

CAPITOLO 3 - Focus legge bilancio 2022

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" contiene alcune disposizioni relative al PNC.

Per il **programma B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016**, l'art. 1 comma 465 ha autorizzato la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Per lo stesso intervento, poi, si segnala l'ulteriore assegnazione disposta dall'art. 43-bis del decreto legge 152/2021, dove si prevede che un importo massimo di 5 milioni di euro delle risorse versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, da trasferire alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo, possa essere destinato agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, inclusi quelli finanziati con le risorse del PNC.

Per il **programma C.12 - Strategia Nazionale Aree interne**, l'art. 1 comma 418 ha previsto un rifinanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse saranno ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto legge n. 59 del 2021¹, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. La disposizione di cui al comma 419 estende agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto legge n. 59 del 2021.

In merito al **programma E.3 - Ecosistema innovativo della salute**, l'art. 1 comma 945, allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, ha istituito la Fondazione «Biotecnopolo di Siena» con funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, nonché con funzioni di hub antipandemico. Al riguardo, l'art. 1 comma 949 prevede che, fermo restando quanto disposto dal decreto legge n. 59 del 2021, le iniziative promosse dalla Fondazione possano altresì essere finanziate con le risorse del programma "E.3 - Ecosistema innovativo della salute" nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022 e nel limite di 340 milioni di euro complessivi, con specifico riferimento alle funzioni di hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per il programma, restano quindi fermi tempistica e obiettivi individuati nella relativa scheda progetto.

¹ Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: a) entità della popolazione residente; b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna; c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica; d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

Allegato 1

Programmi e interventi del PNC

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa (trimestre/anno)	e scadenza
A.4	Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	PCM: Min. Sud	350,00	Invito alla presentazione dei progetti sulla base dell'esito della manifestazione di interesse	Conseguito. Il 30 dicembre con Decreto del Direttore Generale dell'ACT sono state approvati gli elenchi delle idee progettuali "idonee" (177) e di quelle "non idonee" (112) e, contestualmente con lo stesso Decreto, è stato approvato l'Invito - rivolto esclusivamente ai soggetti proponenti delle idee progettuali ritenute idonee - per la presentazione di progetti da ammettere a finanziamento. Il termine per la presentazione dei progetti è stato fissato il 25 febbraio.	I/2022 Provvedimento ammissione a finanziamento dei progetti	di a dei

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa scadenza (trimestre/anno)
B.1.1	Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 A. Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	PCM: Commissario sisma 2016 Dip. "Casa Italia" Struttura di missione sisma 2009.	1.080,00	Individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento; individuazione delle stazioni appaltanti da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure	Conseguito. Ordinanze commissariali: - n. 5 del 23/12/2021 - n. 8 del 30/12/2021 - n. 10 del 30/12/2021 - n. 4 del 23/12/2021 - n. 7 del 30/12/2021 - n. 11 del 30/12/2021 - n. 9 del 30/12/2021 - n. 3 del 20/12/2021 - n. 2 del 16/12/2021 - n. 1 del 16/12/2021 - n. 6 del 30/12/2021	II/2022 Approvazione della progettazione posta a base di gara da parte del soggetto attuatore previa acquisizione delle relative autorizzazioni o concertazioni in sede di conferenza permanente (rispettivamente, del sisma 2016 o di quello 2009);
B.1.2	Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 B. Rilancio economico e sociale		700,00	Individuazione delle iniziative da parte della Cabina di coordinamento	Conseguito. Ordinanze commissariali: - n. 14 del 30/12/2021 - n. 12 del 30/12/2021 - n. 13 del 30/12/2021	II/2022 Pubblicazione degli avvisi pubblici/bandi da parte dei soggetti attuatori
C.1	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIMS	600,00	Nessun adempimento		I/2022 Erogazione anticipazione ai soggetti beneficiari

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.2.1.1 C.2.1.2	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito: - Upgrading nuove navi - Retrofit Navi	MIMS	500,00	Nessun adempimento		I/2022 Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento
C.2.2.1	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi: Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni: - Acquisto navi	MIMS	60,00	Pubblicazione del bando di gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci	Conseguito. Gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci pubblicata in <u>Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 28.12.2021, n. 252.</u> Pubblicato altresì in GURI 5° serie speciale n. 3 del 07.01.2022. Scadenza bando: 22 marzo 2022	II/2022 Aggiudicazione gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci
C.2.2.2	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)	MIMS	20,00	Nessun adempimento		II/2022 Completamento Ibridizzazione Nave Iginia prima nave traghetto treni

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.2.3.1 C.2.3.2	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia: - Microliquefattori (130 mln) - Navi bunkerine (90 mln)	MIMS	220,00	Nessun adempimento		I/2022 Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento
C.3	Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	MIMS	1.550,00	Nessun adempimento		I/2022 D.D. di trasferimento delle risorse a titolo di anticipazione alle regioni. Pubblicazione dei bandi di gara per il 38% dei lavori
C.4.1.1	Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci Locomotori, carri e Raccordi ferroviari Locomotori e carri	MIMS	115,00	Notifica CE per autorizzazione	Conseguito. La notifica è stata effettuata in data 09.09.21.	I/2022 Avvio della procedura di concessione dei contributi

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa scadenza (trimestre/anno)
C.4.1.2	Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci Locomotori, carri e raccordi ferroviari Raccordi ferroviari	MIMS	30,00	Avvio progettazione delle elettrificazioni dei raccordi RFI	Conseguito. Progettazione avviata in data 23.12.2021. Adottato anche Decreto MIMS del 21.12.21, n. 521 per assegnazione risorse a RFI.	II/2022 Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali
C.4.2	Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci Mezzi intermodali Locotrattori, transtainer, gru	MIMS	55,00	Notifica CE per autorizzazione	Conseguito. La notifica è stata effettuata in data 27.12.2021	I/2022 Avvio della procedura di concessione dei contributi
C.5.1	Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) Ponti e viadotti	MIMS	1.000,00	Redazione del progetto di monitoraggio dinamico	Conseguito. Bando e progetto di monitoraggio dinamico predisposti e approvati con determina a contrarre del commissario firmata in data 22.12.2021. Bando pubblicato: il 27.12.2021 su GUUE; il 29.12.2021 su GURI, sito commissario, sito Italferr, "La Repubblica", "Il Giornale", "Il Messaggero", "Il Centro".	I/2022 Avvio della procedura di affidamento per operazioni di monitoraggio dinamico

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa scadenza (trimestre/anno)
C.5.2	Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) Smart Road	MIMS		Nessun adempimento		II/2022 Aggiudicazione del contratto
C.5.3	Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) Traforo del Gran Sasso	MIMS		Avvio progettazione interventi	Conseguito. Progettazione Italferr avviata e certificata dal verbale del 10.11.21 tra Italferr e Struttura commissariale Gran Sasso. Adottata ordinanza commissariale di approvazione del protocollo di intesa operativo del 30.11.21 con commissario emergenza idrica Gran Sasso firmato.	IV/2022 Pubblicazione del bando di gara per l'esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento
C.6	Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	MIMS	450,00	Decreto ministeriale di ripartizione delle somme tra enti gestori	Conseguito. Decreto MIMS del 21.12.21, n. 522 di ripartizione delle somme tra gli enti gestori.	II/2022 - Decreto direttoriale di approvazione dei Piani operativi predisposti da Anas; - Protocolli d'intesa di approvazione dei Piani operativi predisposti dai gestori delle tratte autostradali

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa scadenza (trimestre/anno)
C.7	Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	MIMS	1.470,00	D.D.: accordi procedimentali con ciascuna ADSP	Conseguiti. Stipulati tutti gli accordi procedimentali con le ADSP relativamente agli interventi da realizzare.	I/2022 Trasferimento risorse a soggetti attuatori
C.8	Aumento selettivo della capacità portuale	MIMS	390,00			
C.9	Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	MIMS	250,00			
C.10	Efficientamento energetico	MIMS	50,00			
C.11	Elettificazione delle banchine (Cold ironing)	MIMS	700,00			
C.12	Strategia Nazionale Aree Interne	MIMS	300,00	Condivisione e scelta degli interventi da parte dei Comitati Aree interne e soggetti gestori delle strade individuate	Conseguito. Convocate tutte le 72 assemblee dei sindaci (Comitati Aree interne). L'obiettivo si considera conseguito in quanto la tappa successiva prevede la predisposizione (e l'invio) dei piani operativi con gli interventi e i relativi CUP come previsto dall'art. 6 co, 1 del Decreto MIMS di concerto con il Ministero del sud e la coesione territoriale e il MEF di riparto delle risorse per aree interne, del 13.10.21, n. 394.	I/2022 Predisposizione, da parte dei S.A., dei Piani operativi di intervento

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa scadenza (trimestre/anno)
C.13	Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	MIMS	2.000,00	<p>Publicazione dei Bandi da parte delle Regioni per individuazione proposte e conseguente predisposizione della programmazione degli interventi da parte delle Regioni</p>	<p>Conseguito.</p> <p>Effettuata la pubblicazione dei bandi da parte di tutte le Regioni e PA per individuazione proposte da parte degli ex Istituti autonomi case popolari, dei Comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi case popolari per la programmazione degli interventi. Ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 15 settembre 2021 il Piano degli interventi deve essere trasmesso al MIMS entro il termine del 15 gennaio 2022 ai fini dell'approvazione.</p>	<p>I/2022</p> <p>Trasmissione della Programmazione degli interventi da parte delle Regioni al MIMS e al Dipartimento Casa Italia con conseguente adozione del Decreto MIMS, di concerto con Casa Italia, di approvazione della Programmazione. Individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, regionali o enti locali) da parte delle Regioni.</p>

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa scadenza (trimestre/anno)
D.1	Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	MIC	1.455,24	<p>Approvazione del Piano di supporto tecnico e convenzioni e contratti per l'affidamento dei servizi di AT.</p> <p>Sottoscrizione dei Disciplinari d'obbligo con i soggetti attuatori e conseguente concessione delle anticipazioni (sulla base di QE preliminare).</p>	<p>Conseguito.</p> <p>Il Piano di supporto e l'assistenza tecnica sono garantiti da Ales SpA, Società in house del MiC, che svolge per il MiC i Servizi di supporto al Segretariato Generale, nell'ambito del Contratto rep. n. 83 del 17 novembre 2021. Nell'ambito di detto contratto il 28 dicembre 2021 è stata presentata dal MiC la richiesta di servizi di supporto tecnico, riscontrata, in pari data, dalla società.</p> <p>Sottoscritti, tra il 29 e 30 dicembre 2021, tutti i disciplinari d'obbligo per i 14 interventi tra il Segretario generale e i rappresentanti legali dei Soggetti Attuatori ad eccezione dell'intervento "Cammini" rientrante nel più ampio intervento 12 -Percorsi nella Storia), in quanto attuato dagli uffici del medesimo segretariato. Pertanto, per detto intervento non si è ritenuto di dover sottoscrivere un apposito disciplinare. L'amministrazione</p>	<p>II/2022</p> <p>Pubblicazione dei Bandi di gara per appalto lavori e servizi per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.</p>

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa scadenza (trimestre/anno)
					procederà nel mese di gennaio 2022 all'erogazione delle anticipazioni a seguito delle richieste dei Soggetti Attuatori, come previsto all'articolo 8 dei disciplinari d'obbligo.	
E.1.1	Salute, ambiente, biodiversità e clima Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	SALUTE	415,38	Nessun adempimento		I/2022 Pubblicazione bando per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA).
E.1.2	Salute, ambiente, biodiversità e clima Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	SALUTE	49,50	Nessun adempimento		IV/2022 Provvedimenti per l'identificazione dei siti contaminati e definizione del piano di interventi integrati.

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativo (trimestre/anno) e scadenza
E.1.3	Salute, ambiente, biodiversità e clima Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute- ambiente-clima	SALUTE	6,12	Nessun adempimento		II/2022 Adozione provvedimento per definizione Piano di azione MdS-ISS; provvedimento di istituzione del SNPS
E.1.4	Salute, ambiente, biodiversità e clima Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute- ambiente-clima	SALUTE	21,00	Nessun adempimento		II/2022 Pubblicazione bando
E.1.5	Salute, ambiente, biodiversità e clima Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS	SALUTE	8,00	Nessun adempimento		II/2022 Piano di azione MdS- ISS
E.2	Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	SALUTE	1.450,00	Nessun adempimento		II/2022 Decreto ministeriale di approvazione del piano d'azione con individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse alle Regioni

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa scadenza (trimestre/anno)
E.3	Ecosistema innovativo della salute	SALUTE	437,40	Nessun adempimento		I/2022 Perfezionamento del decreto di approvazione della procedura ad evidenza pubblica
F.1	"Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MISE	800,00	Autorizzazione UE	Parzialmente conseguito. L'amministrazione è in attesa del riscontro definitivo da parte della Commissione europea. L'ottenimento dell'autorizzazione esula dalla disponibilità dell'amministrazione titolare che ha comunque posto in essere le attività necessarie al raggiungimento dello stesso rispondendo alle richieste di chiarimento e integrazione della Commissione europea.	I/2022 Pubblicazione dei bandi di gara

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa scadenza (trimestre/anno)
F.3	Accordi per l'Innovazione	MISE	1.000,00	<p>DM semplificazione amministrativa MISE</p> <p>Convenzione tra Ministero e Soggetto gestore per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto adempimenti connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse.</p>	<p>Conseguito.</p> <p>Decreto MISE per la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto 24 maggio 2017 e s.m.i, firmato in data 31/12/2021.</p> <p>In data 30/12/2021, la DGIAl ha sottoscritto la Convenzione con MedioCredito Centrale–Banca del Mezzogiorno SpA, soggetto capofila del RTI.</p>	I/2022 Adozione Decreto direttoriale di apertura sportello e definizione termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa scadenza (trimestre/anno)
G.1.1	Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti	GIUSTIZIA	84,00	Nessun adempimento		I/2022 50% dei bandi di gara pubblicati per l'affidamento del servizio di ingegneria/architettura
G.1.2	Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	GIUSTIZIA	48,90	Nessun adempimento		I/2022 75% dei bandi di gara pubblicati per l'affidamento del servizio di ingegneria/architettura
H.1	Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	MIPAAF	1.203,30	Decreto ministeriale per la definizione del regime aiuti del settore agroalimentare (e florovivaistico)	Parzialmente conseguito. Decreto ministeriale prot. n. 673777 del 22/12/2021	I/2022 Pubblicazione bandi altri settori

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa (trimestre/anno) e scadenza
				<p>Pubblicazione nuovo bando settore agroalimentare e florovivaistico.</p> <p>Definizione regime di aiuti per altri settori: - pesca e acquacoltura - silvicoltura</p>	<p>L'Amministrazione è in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo del DM prot. n. 673777 del 22/12/2021. In un'ottica prudenziale ha, pertanto, ritenuto di vincolare la pubblicazione del nuovo bando e degli annessi allegati, già predisposti e finalizzati, all'avvenuta registrazione.</p> <p>Decreto direttoriale della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura n. 354516 del 3 agosto 2021 di approvazione dell'Avviso pubblico di consultazione tecnica per la costruzione della misura di aiuto "contratti di filiera del settore ittico".</p> <p>In merito al settore silvicoltura, la misura è stata presentata alle aziende della filiera e a tutto il partenariato del settore durante il Tavolo di Filiera del Legno (istituito ai sensi del DM 14 settembre 2018, n. 8746) del 12 ottobre 2021 e al Tavolo Concertazione Permanente del Settore Forestale il 29 novembre 2021. In attesa di eventuali osservazioni da parte del</p>	

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al IV trimestre 2021	Stato obiettivo al 31 dicembre 2021	Prossimo adempimento relativa (trimestre/anno) e scadenza
					partenariato e degli stakeholder coinvolti.	
I.1	Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	MUR	500,00	Nessun adempimento		II/2022 Pubblicazione da parte del MUR del primo bando (in due finestre) per il finanziamento di progetti di ricerca; Apertura della prima finestra del primo bando

Programmi e interventi cofinanziati - disposizioni inserite nel D.L. n. 152 del 2021

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (in mln/€)	Aggiornamenti
A.1	Servizi digitali e cittadinanza digitale	PCM MITD	350,00	<p>Art. 28 - Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati</p> <p>Finalità: le Camere di Commercio mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.</p> <p>Scadenze e adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: stipula di una convenzione tra la struttura PCM-MITD, MISE, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID e la società PagoPA, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti; • entro il 2024 adozione di un DM MITD-MEF per definizione oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio; • PCM MITD comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. <p>Risorse utilizzate: 10 milioni di euro complessivi nel triennio 2021-2023 per predisporre i sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio, consentirne l'erogazione e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023.</p> <p>Art. 28-bis - Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche</p> <p>Implementazione della piattaforma Sistema PagoPA. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici sono svolti dalla società PagoPA.</p>

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (in mln/€)	Aggiornamenti
				<p>Finalità: incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali e consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica.</p> <p>Scadenze e adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definizione del cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici, nonché delle modalità di attuazione della disposizione e di funzionamento della piattaforma con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza. • Determinazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dei casi di utilizzo della piattaforma nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dai decreti attuativi. • Stipula tra Ministero dell'economia e delle finanze e PagoPA di una o più convenzioni, a titolo non oneroso, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici nonché le modalità di accreditamento dei medesimi. • Con cadenza semestrale la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. <p>Risorse utilizzate: per la progettazione e la realizzazione da parte di PagoPA S.p.A. dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023.</p>

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (in mln/€)	Aggiornamenti
A.2	Servizi digitali e competenze digitali	PCM MITD	250,00	<p>Art. 29 - Fondo per la Repubblica Digitale Istituzione del «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale.</p> <p>Finalità: sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale per accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea, mediante il riconoscimento alle fondazioni di cui sopra di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati.</p> <p>Scadenze e adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza data: stipula di un protocollo di intesa tra MITD e MEF per definire modalità di intervento del Fondo individuare le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo. • Senza data: dPCM o decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il MEF per la definizione delle procedure per la concessione del contributo, nel rispetto del limite di spesa stabilito • PCM-MITD comunica con cadenza semestrale al MEF, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. <p>Risorse utilizzate: intero stanziamento.</p>

Rif.	Programma/ investimento/ intervento	Amm.	Importo (in mln/€)	Aggiornamenti
L.1	Piani urbani integrati		210,00	<p>Art. 21 – Piani integrati Assegnazione delle risorse alle città metropolitane (Integrazione delle risorse PNRR della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2.» con le risorse PNC). Indicazione dei criteri per la ripartizione delle risorse.</p> <p>Finalità: finanziamento progetti (Costo minimo 50 milioni di euro) volti alla manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico</p> <p>Scadenze e adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto adozione di un decreto del Ministero dell'interno per l'approvazione del modello di presentazione delle proposte progettuali integrate; • entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le città metropolitane provvedono ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana; • entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le città metropolitane comunicano al Ministero dell'interno i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi; • entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: <ul style="list-style-type: none"> ○ decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ○ sigla di uno specifico «atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori <p>Risorse utilizzate: intero stanziamento.</p>

